

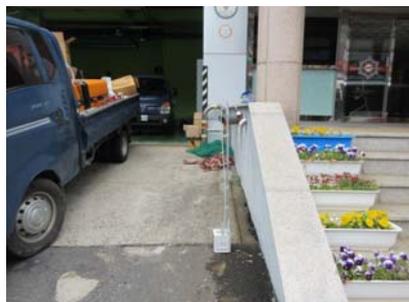
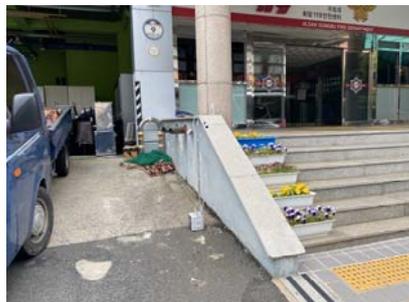
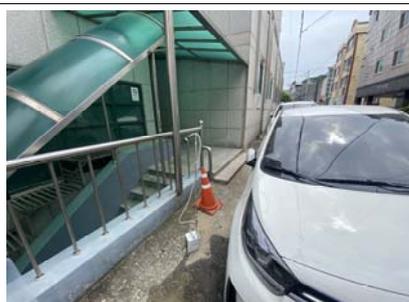
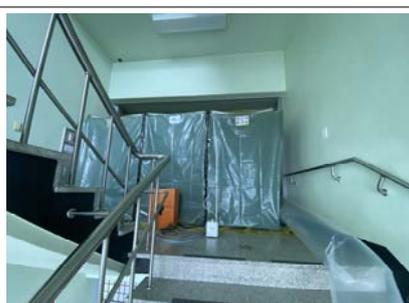


**[별첨1] 측정결과 (실내 사업장)**

측정 위치	시료번호	측정지점	장비 번호	측정일시	유량 (l/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면	초과여부
P1	0526B-1	부지경계선①	45	09:50 ~ 13:50 240 min	10.27	0.002	백석면	미만
P2	0526B-2	부지경계선②	34	09:52 ~ 13:52 240 min	10.30	0.002	백석면	미만
P3	0526B-3	부지경계선③	37	09:54 ~ 13:54 240 min	10.23	0.001	백석면	검출한계 미만
P4	0526B-4	부지경계선④	33	09:56 ~ 13:56 240 min	10.32	0.001	백석면	검출한계 미만
P5	0526B-5	위생설비 지점	48	10:05 ~ 11:05 60 min	10.43	0.003 (시야수 200)	백석면	검출한계 미만
P6	0526B-6	음압기 배출구①	42	13:30 ~ 14:30 60 min	10.41	0.003 (시야수 200)	백석면	검출한계 미만
P7	0526B-7	음압기 배출구②	40	13:32 ~ 14:32 60 min	10.42	0.003 (시야수 200)	백석면	검출한계 미만
P8	0526B-8	작업장주변 (실내)①	47	10:00 ~ 12:00 120 min	10.29	0.001	백석면	검출한계 미만
P9	0526B-9	작업장주변 (실내)②	38	10:02 ~ 12:02 120 min	10.30	0.002	백석면	검출한계 미만
		폐기물 반출구	측정 제외(폐기물 반출 없음)					
		폐기물 보관지점	측정 제외(폐기물 보관 없음)					
		작업장 주변 (실외)	측정 제외(부지경계선 대상 건축물 주변 5m 이내)					

※ 측정장비 모델명 : 캠익코퍼레이션 KMS-5100

**[별첨2] 측정사진**

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선①	측정 시작 시간 : 09:50 	측정 종료 시간 : 13:50 	
부지경계선②	측정 시작 시간 : 09:52 	측정 종료 시간 : 13:52 	
부지경계선③	측정 시작 시간 : 09:54 	측정 종료 시간 : 13:54 	
부지경계선④	측정 시작 시간 : 09:56 	측정 종료 시간 : 13:56 	
위생설비 지점	측정 시작 시간 : 10:05 	측정 종료 시간 : 11:05 	

**[별첨2] 측정사진**

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구①	측정 시작 시간 : 13:30 	측정 종료 시간 : 14:30 	
음압기 배출구②	측정 시작 시간 : 13:32 	측정 종료 시간 : 14:32 	
작업장주변 (실내)①	측정 시작 시간 : 10:00 	측정 종료 시간 : 12:00 	
작업장주변 (실내)②	측정 시작 시간 : 10:02 	측정 종료 시간 : 12:02 	
